



# PROVINCIA DI POTENZA

## UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA"  
FSC 2014-2020  
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della  
S. P. n.7 "Agri Sinni"

### PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

	1	2
--	---	---

Titolo elaborato :

Cronoprogramma dei Lavori (GANT)

Scala:

Data:

ottobre 2021

Progettista:

Ing. Biagio Cappa

Responsabile del Procedimento:

Ing. Nicola Rubino

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:


	<b>Provincia di Potenza</b> Ufficio Viabilità e Trasporti
	<div style="text-align: center;"> <b>DIAGRAMMA DI GANT</b>  <b>Cronoprogramma dei Lavori</b>          (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)       </div>
<b>OGGETTO:</b>	Fondi FSC 2014-2020 – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S. P. n. 7 "Agri – Sinni". CUP: H77H17000660001
<b>COMMITTENTE:</b>	UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
<b>CANTIERE:</b>	S. P. n. 7 "Agri – Sinni"
	Potenza, lì 22/10/2021  <div style="text-align: center;"> <b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA</b>          (Ing. Cappa Biagio)       </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>   <b>IL R.U.P.</b>          (Ing. Rubino Nicola)       </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> </div>
	Ing. Cappa Biagio Piazza Delle Regioni, 1 85100 POTENZA (PZ) 0971/417.469 - 0971/417.384 biagio.cappa@provinciapotenza.it

FSC 2014-2020 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 7 “Agri – Sinni”

Cronoprogramma delle attività

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio presunto	Fine presunta	Durata gg.
1	A	allestimento cantiere	12/04/2022	14/04/2022	2
2	B	esecuzione terra armata	14/04/2022	14/05/2022	30
3	C	esecuzione pulizia cunette e rifacimento muretti	14/05/2022	03/06/2022	20
4	D	esecuzione decespugliamento e sfangamento	03/06/2022	23/06/2022	20
5	E	esecuzione pavimentazione stradale	23/06/2022	23/07/2022	30
6	F	Installazione barriere di protezione	23/07/2022	06/09/2022	45
7	G	Realizzazione segnaletica stradale	06/09/2022	06/10/2022	30
8	H	smobilizzo cantiere	06/10/2022	09/10/2022	3

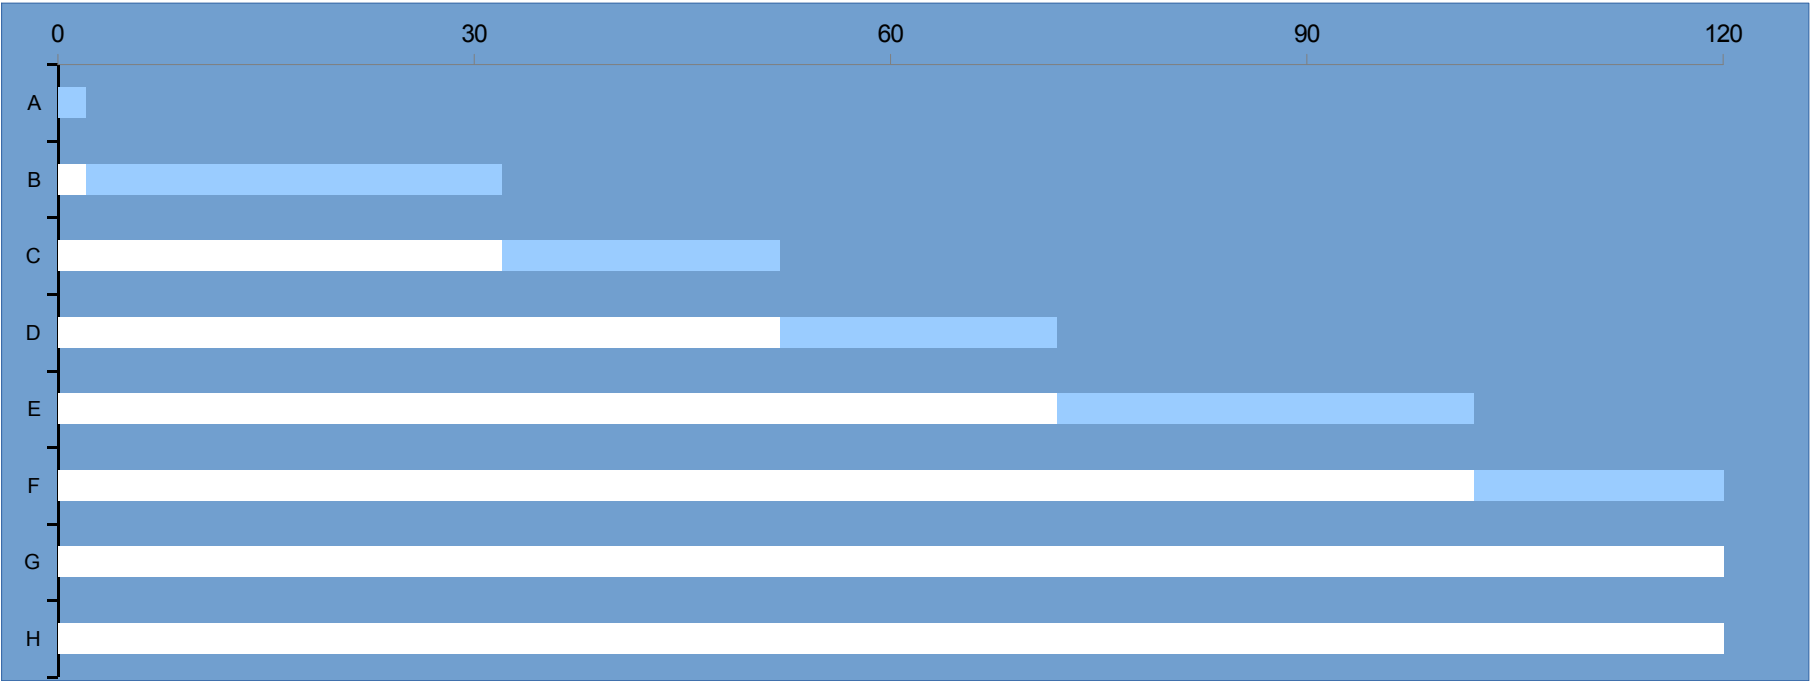

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

180 gg

TC

180 gg.  
naturali consecutivi
