



PROVINCIA DI POTENZA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S.  
"DE SARLO" DI LAGONEGRO  
VIA SANT'ANTUONO  
CODICE EDIFICIO 760390475

CUP: H61I18000130001



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Manuela CORINGRATO (Capogruppo)

S. & S. ENGINEERING Srls

Geom. Domenico Franco GIOIA

Geol. Mario CHIORAZZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Ing. Tiziana CAPPA

ELABORATO:

Cronoprogramma dei Lavori  
(Revisione)

Tav. N.

**A.7**

Data:

Novembre 2022

Scala:



(Provincia di Potenza)

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S.  
"DE SARLO" DI LAGONEGRO


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data inizio lavori: Data verbale consegna lavori

Data fine lavori: 180 gg dalla data verbale consegna lavori

N. ord.	Attività	Importo Lavorazioni	Durata lavorazioni gg.	Durata gg. consecutivi
1	Allestimento Cantiere e Segnaletica	€ 4 096,98	7	7
2	Operi provvisionali	€ 32 847,58	18	20
3	Realizzazione rampa e lavorazioni connesse	€ 81 745,25	20	26
4	Lavori in copertura	€ 67 081,50	30	45
5	Lavorazioni opere interne	€ 16 356,26	10	45
6	Consolidamento nodi in c.a., ancoraggio piastre dissipatori su strutture esistenti e lavorazioni connesse	€ 247 848,75	50	70
7	Rimozione pavimentazione esistente, scavi di fondazione, realizzazione fondazioni per esoscheletri, realizzazione reti scarichi, trasporto e conferimenti a discarica	€ 146 903,95	45	115
8	Montaggio esoscheletri in acciaio, Dissipatori e relativi apprestamenti	€ 862 177,30	35	150
9	Frangisole, vetrata pensilina e relativi apprestamenti	€ 89 626,64	20	155
10	Ripristino pavimentazioni esterne	€ 30 298,70	30	180

TOTALE LAVORAZIONI	€ 1 578 982,91	180
--------------------	----------------	-----

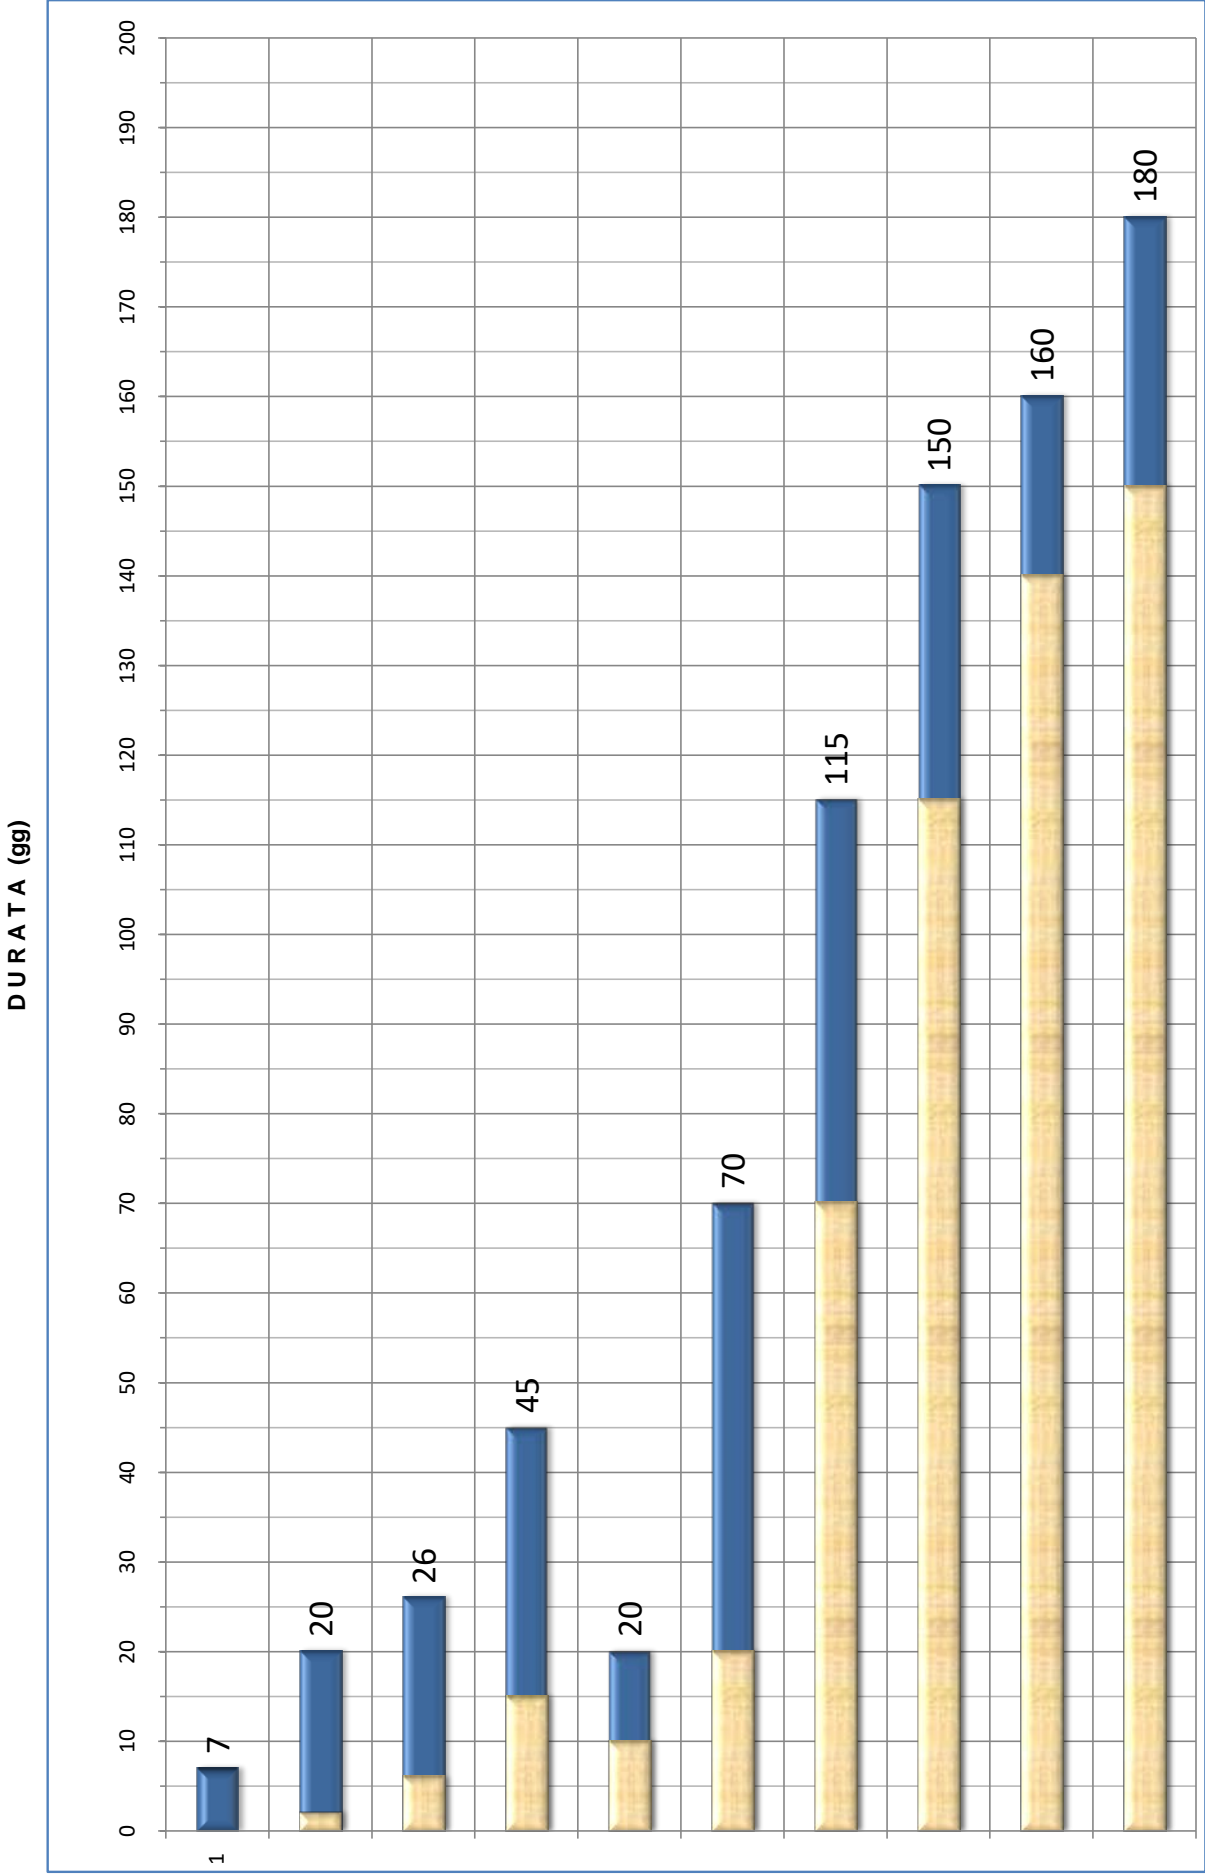

Inizio dei lavori	0	gg
-------------------	---	----

giorni naturali consecutivi

Fine lavori	180	gg
-------------	-----	----
