



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle S.P. n. ex ss 381 "del passo delle Crocelle" - SP 72 "di Stagliuzzo" - SP 93 bis - SP 70 "Inforchia - S. Ilario" - Cod. Int. 01734.20.PZ

CUP:H57H20001550001

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 9

Titolo elaborato :

Cronoprogramma dei Lavori (diagramma di Gantt)

Scala:

//

Data:

Settembre 2024

Progettista:

ing. Nicola RUSSO




Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesca CROATTO

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

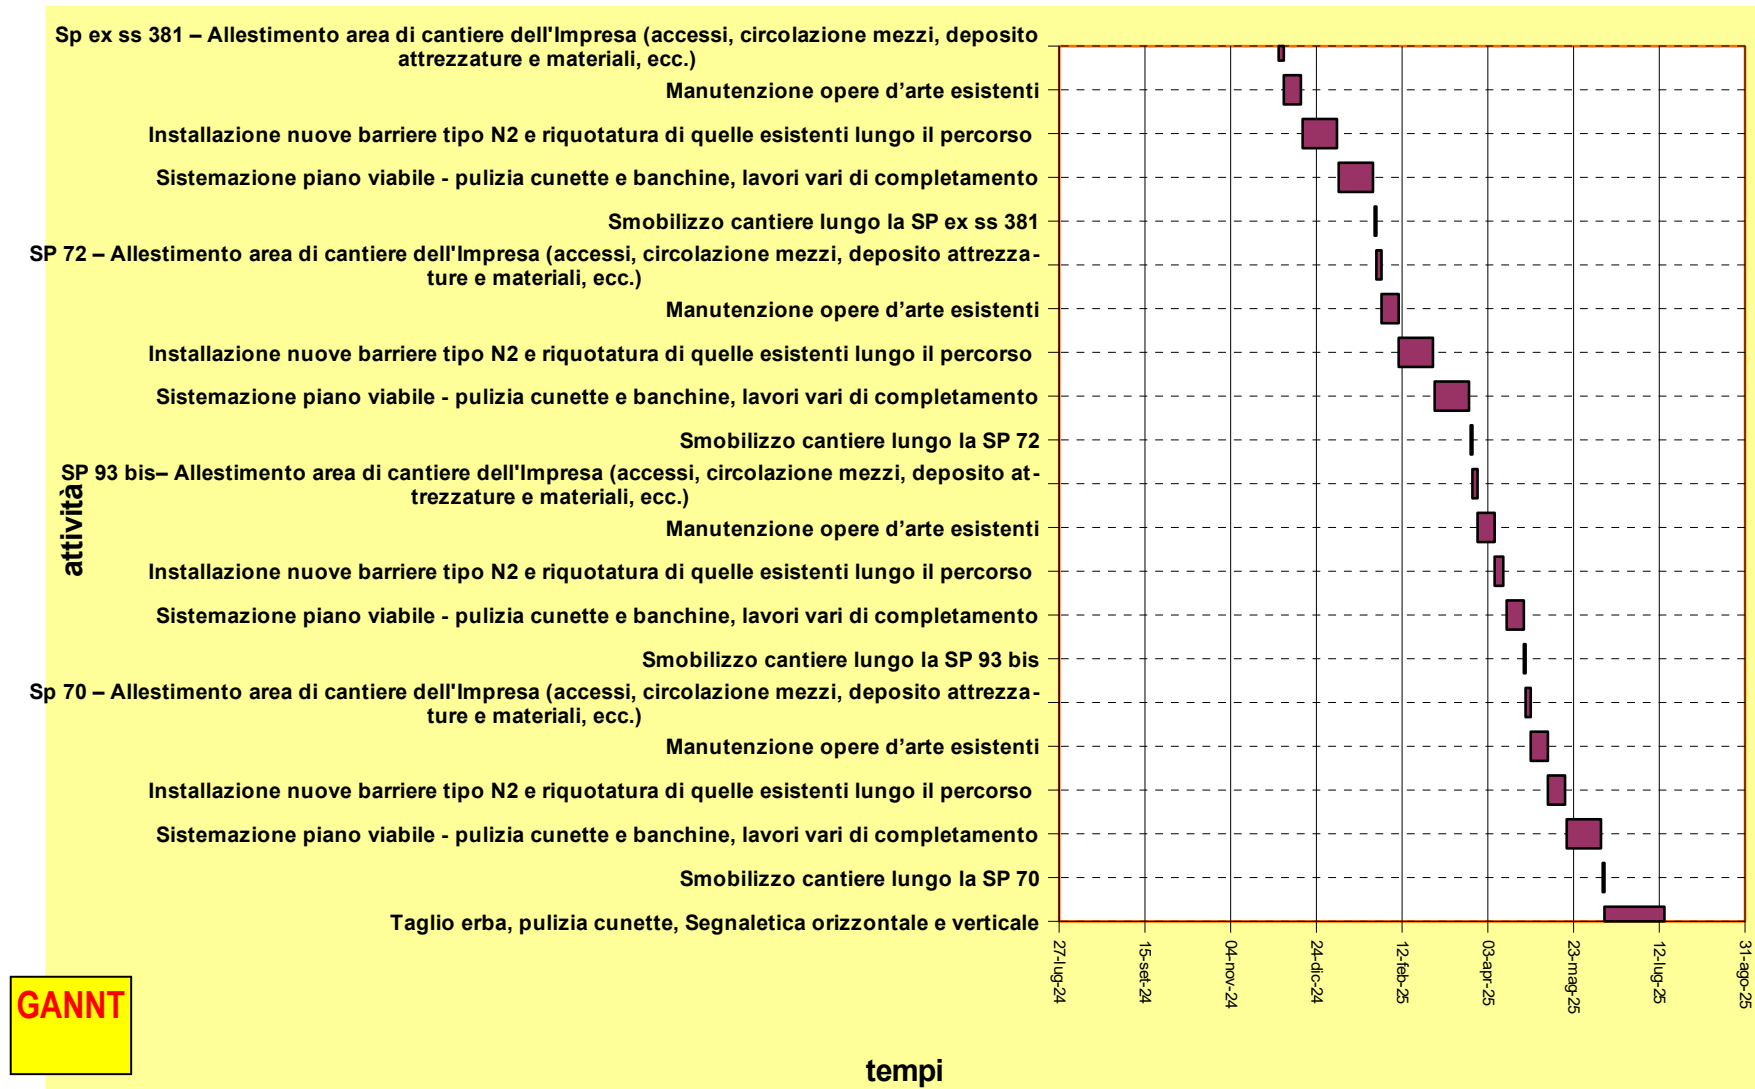

Lavori di Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle S.P. ex ss 381 - 72 - 93BIS
- 70

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT

	Intervallo temporale dell'intero lavoro	2-dic-24	224	14-lug-25
N.	fase lavorativa	data inizio	durata gg.	fine
	Sp ex ss 381 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)			
1		02/12/2024	3	04/12/2024
2	Manutenzione opere d'arte esistenti	05/12/2024	10	14/12/2024
3	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	16/12/2024	20	04/01/2025
4	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	06/01/2025	20	25/01/2025
5	Smobilizzo cantiere lungo la SP ex ss 381	27/01/2025	1	27/01/2025
	SP 72 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)			
6		28/01/2025	3	30/01/2025
7	Manutenzione opere d'arte esistenti	31/01/2025	10	09/02/2025
8	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	10/02/2025	20	01/03/2025
9	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	03/03/2025	20	22/03/2025
10	Smobilizzo cantiere lungo la SP 72	24/03/2025	1	24/03/2025
	SP 93 bis – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)			
11		25/03/2025	3	27/03/2025
12	Manutenzione opere d'arte esistenti	28/03/2025	10	06/04/2025
13	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	07/04/2025	5	11/04/2025
14	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	14/04/2025	10	23/04/2025
15	Smobilizzo cantiere lungo la SP 93 bis	24/04/2025	1	24/04/2025
	Sp 70 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)			
16		25/04/2025	3	27/04/2025
17	Manutenzione opere d'arte esistenti	28/04/2025	10	07/05/2025
18	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	08/05/2025	10	17/05/2025
19	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	19/05/2025	20	07/06/2025
20	Smobilizzo cantiere lungo la SP 70	09/06/2025	1	09/06/2025
21	Taglio erba, pulizia cunette, Segnaletica orizzontale e verticale	10/06/2025	35	14/07/2025
