CRONOPROGRAMMA LAVORI
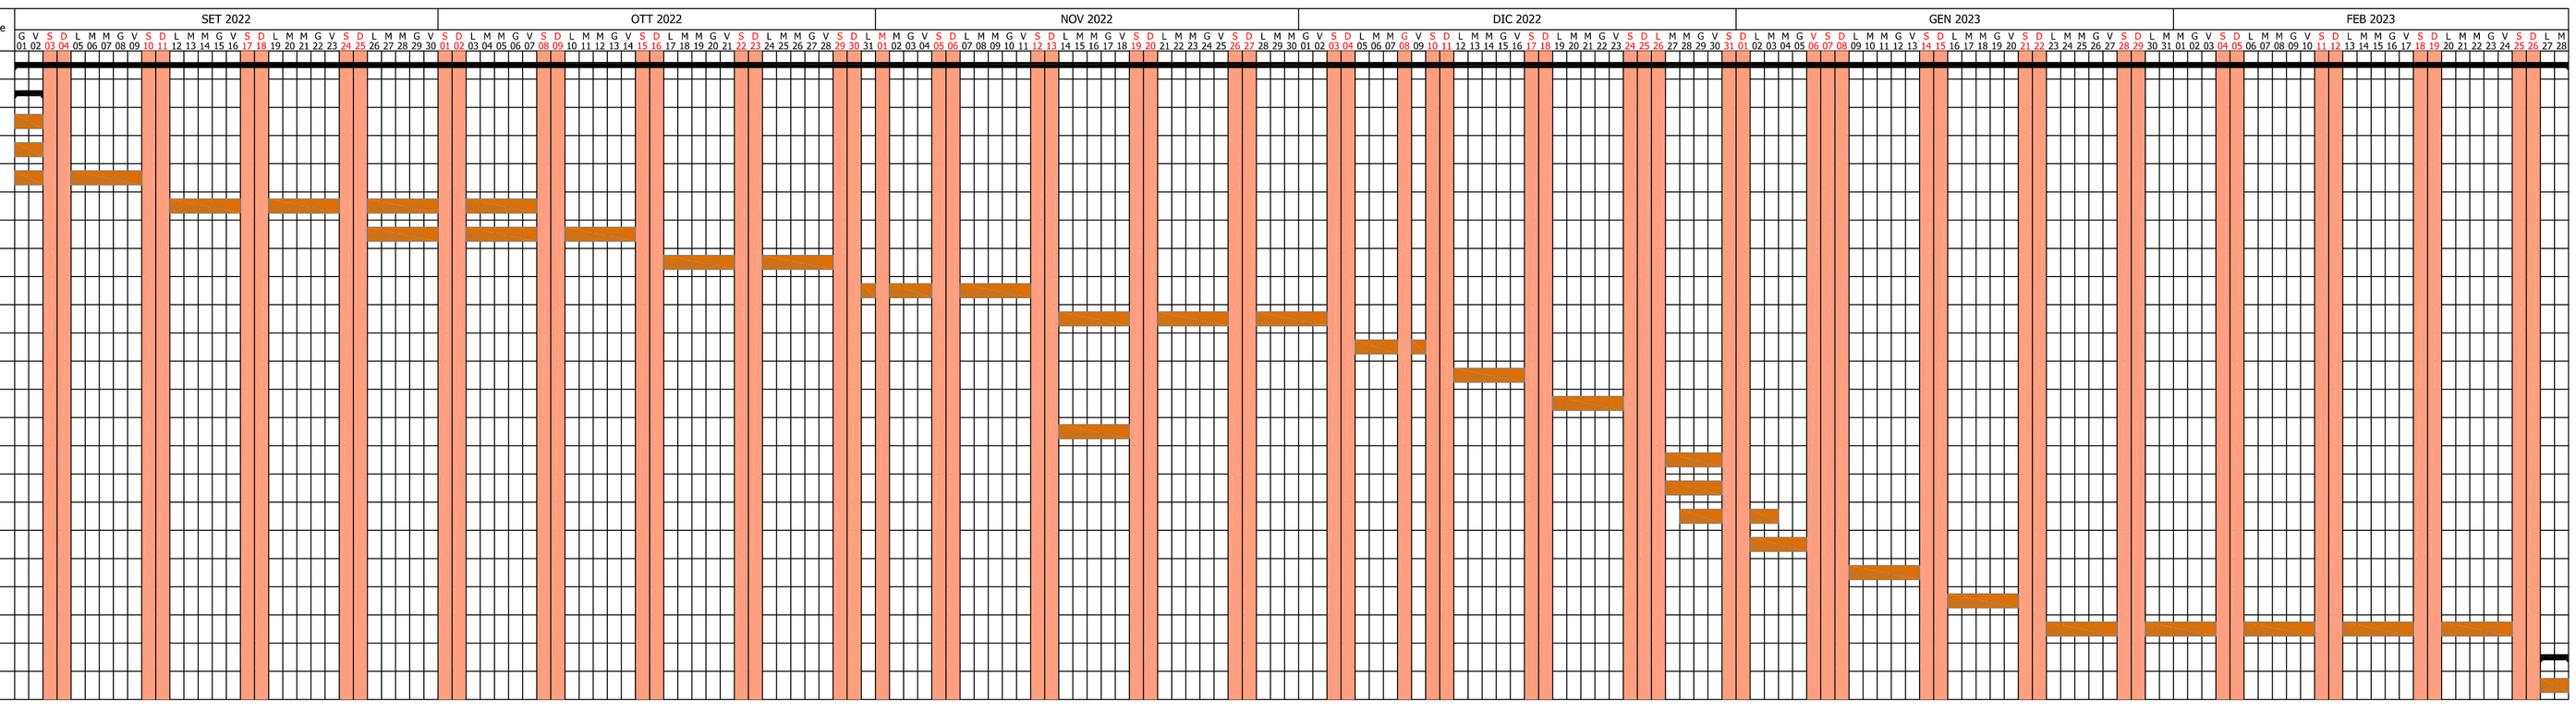
Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	125/181	01/09/2022	28/02/2023						
Allestimento cantiere	2/2	01/09/2022	02/09/2022						
Baracche di cantiere	2/2	01/09/2022	02/09/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Servizi igienici di cantiere	2/2	01/09/2022	02/09/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Preparazione, delimitazione e sgombero area	7/7	01/09/2022	09/09/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	20/20	12/09/2022	07/10/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	15/15	26/09/2022	14/10/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	10/10	17/10/2022	28/10/2022	Intero cantiere	1	4	4	45	
Fondazioni in cls armato (1)	9/9	31/10/2022	11/11/2022	Intero cantiere	1	5	5	3	
Solaio in cemento armato a soletta piena	15/15	14/11/2022	02/12/2022	Intero cantiere	1	5	5	8	
Impermeabilizzazione pareti, con malte > 2 m	4/4	05/12/2022	09/12/2022	Intero cantiere	1	2	2	40	
Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	5/5	12/12/2022	16/12/2022	Intero cantiere	1	3	3	30	
Realizzazione di copertura con pannelli finto coppo	5/5	19/12/2022	23/12/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Installazione impianto di messa a terra	5/5	14/11/2022	18/11/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	4/4	27/12/2022	30/12/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione	4/4	27/12/2022	30/12/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Posa di condutture in materiale plastico pesante	5/5	28/12/2022	03/01/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Rinfianco e rinterro tubazioni	4/4	02/01/2023	05/01/2023	Intero cantiere	1	3	3	400	
Massetti esterni in cls con betonpompa	5/5	09/01/2023	13/01/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Realizzazione di lastricati in basole	5/5	16/01/2023	20/01/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Posa in opera lapidi	25/25	23/01/2023	24/02/2023	Intero cantiere	1	3	3	10	
Smobilizzo cantiere	2/2	27/02/2023	28/02/2023						
Servizi igienici di cantiere	2/2	27/02/2023	28/02/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
